

# 葉山町クリーンセンター再整備工事のお知らせ第18号

令和5年12月1日発行

| 施工エリア | 工事種別(計画)                | 施設、設備内容   | R5.3 R5.4 R5.5 R5.6 R5.7 R5.8 R5.9 R5.10 R5.11 R5.12 R6.1 R6.2 R6.3 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------------------------|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |                         |   | 計画  | 実績 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計画    | 設計・許認可等                 | 設計図書作成  | [計画線]   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |                         | 許認可   | [実績線]   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A工区   | 退出路の拡幅工事                | 既存石積、一部舗装、一部階段等の撤去<br>擁壁工事<br>下水道、雨水排水路の整備工事<br>新規退出路の造成、舗装、路上の整備工事 | [計画線]   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |                         | し尿処理施設(焼却炉)、ごみ焼却設備等   | [実績線]   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B工区   | 既存施設解体工事                |   | [計画線]   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 仮設排水槽設置工事               |   | [実績線]   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 地盤整地工事                  |   | [計画線]   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 7号降壁、電力機室設置工事           |   | [実績線]   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 敷地造成、建物基礎改良工事           |   | [計画線]   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 新設建物建設工事(1)<br>2階建物     | 休憩棟   | [実績線]   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 新設建物建設工事(2)<br>1階建物     | 倉庫、車庫棟、サテライトセンター、小物類SY、プラスチックSY                                     | [実績線]   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 新設ストックヤード設置工事           | 剪定枝SY   | [実績線]   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C工区   | 新設計量機設置工事               | 基礎工事、<br>仮設計量機用ユニットハウス、計量用パソコン設置                                    | [計画線]   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 通路付帯設備                  | 電線管路増設、給排水管路増設、雨水排水側溝、ガードレール、カーブミラー、外灯                              | [実績線]   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 仮設設備設置工事                |   | [計画線]   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 目エリア内舗装工事               | コンクリート又はアスファルト  | [実績線]   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 仮設工事                    | 工事使用ヤードの仮囲い設置<br>工事用資材置き場等の整備                                       | [計画線]   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D工区   | 既存施設解体工事                | ゴミ焼却施設、事務所、既設計量機等   | [計画線]   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | コンクリート再生材用敷地整備、製造機設置工事  |   | [実績線]   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 解体完了後敷地埋戻し整地<br>発酵機東側掘削 | コンクリート再生砕石使用  | [実績線]   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E工区   | 仮設置場設置工事                | びん類SY、ペットボトルSY、プラスチックSY   | [実績線]   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 新設ストックヤード設置工事           | びん類SY、ペットボトルSY  | [実績線]   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 外構工事                    | 雨水側溝、As舗装   | [実績線]   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 工事実績

11月は、びん類ストックヤード、ペットボトルストックヤードの足場の解体や周辺の横断側溝の設置を行っています。また、新築の管理棟の周辺にある雨水側溝の設置を行っています。

## 【工事状況】



〔びん類SY足場解体前〕



〔びん類SY足場解体完了〕



〔ペットボトルSY足場解体前〕



〔ペットボトルSY壁打設完了〕




〔雨水側溝設置前〕



〔雨水側溝設置完了〕

## 現場全体図

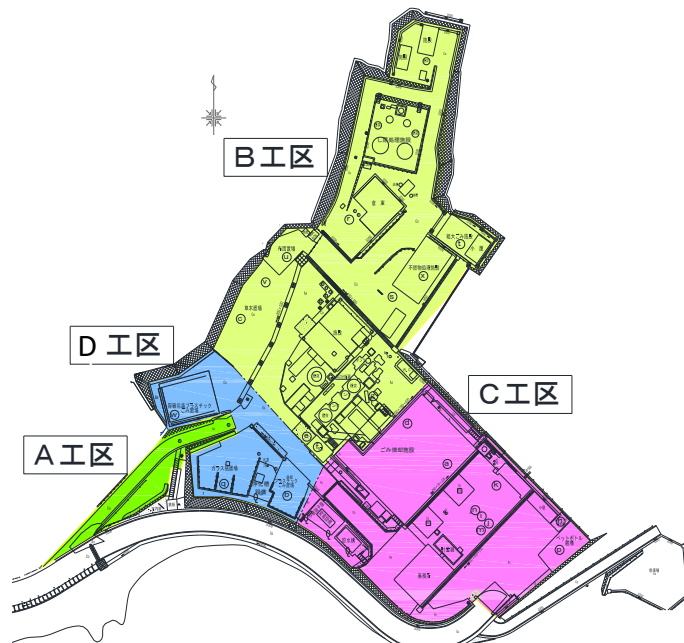

## 今後の予定

- ・・・新築工事
- ・・・雨水排水



雨水側溝の敷設を行っていきます。

びん類ストックヤード・ペットボトルストックヤード周辺のアスファルト舗装を行っていきます。

管理棟建設開始前に雨水側溝の敷設引き続き行っていきます。

## ドローンによる撮影



令和5年 11月25日撮影

## 現場代理人よりあいさつ

年末に向け、何かとお忙しくお過ごしのことと存じますが、葉山町民の皆様にもお変わりはございませんでしょうか。

各地で幻想的なイルミネーションやクリスマスイベントなどの楽しいイベントが多くあるかと思えます。これらのイベントなどを楽しみながら良い新年を迎えられることを祈っております。

葉山町クリーンセンターでは、新設工事を行う前に雨水排水工事を行っています。引き続き安全を心掛けながら工事を行って参りますので、ご協力の程、宜しくお願い致します。

現場代理人 岩井俊郎

## 連絡先

【発注者】 葉山町長

担当連絡先 葉山町クリーンセンター再整備担当  
046-876-1111(内線 455・456)

【施工業者】 共和化工(株) 関東支店

担当連絡先 現場事務所(クリーンセンター2階) 046-874-5470  
現場代理人 岩井俊郎  
監理技術者 田端秀人 土生正元
