

葉山町クリーンセンター再整備工事のお知らせ第20号

令和6年2月1日発行

| 施工区 | 工事種別(計画) | 施設、設備内容 | 計画 | | | | | | | | | | | | 実績 | |
|------|----------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|--|
| | | | R5.3 | R5.4 | R5.5 | R5.6 | R5.7 | R5.8 | R5.9 | R5.10 | R5.11 | R5.12 | R6.1 | R6.2 | R6.3 | |
| A 工区 | 設計・許認可等 | 設計図書作成 | [計画] | | | | | | | | | | | | | |
| | | 許認可 | [計画] | | | | | | | | | | | | | |
| A 工区 | 退出路の拡幅工事 | 既存石積、一部舗装、一部階段等の撤去 | [計画] | | | | | | | | | | | | | |
| | | 擁壁工事 下水道、雨水排水路の整備工事 新規退出路の造成、舗装、路上の整備工事 | [計画] | | | | | | | | | | | | | |
| B 工区 | 既存施設解体工事 | し尿処理施設(焼却炉)、ごみ焼却設備等 | [計画] | | | | | | | | | | | | | |
| | 仮設排水柵設置工事 | | [計画] | | | | | | | | | | | | | |
| | 地盤整地工事 | | [計画] | | | | | | | | | | | | | |
| | し尿擁壁、重力擁壁設置工事 | | [計画] | | | | | | | | | | | | | |
| | 敷地造成、建物基礎改良工事 | | [計画] | | | | | | | | | | | | | |
| | 新設建物建設工事(1) | 休憩棟 | [計画] | | | | | | | | | | | | | |
| | 新設建物建設工事(2) | 倉庫、車庫棟、サテライトセンター、小物類SY、プラスチックSY | [計画] | | | | | | | | | | | | | |
| C 工区 | 新設ストックヤード設置工事 | 剪定枝SY | [計画] | | | | | | | | | | | | | |
| | 新設計量機設置工事 | 基礎工事、 仮設計量機用ユニットハウス、計量用パソコン設置 | [計画] | | | | | | | | | | | | | |
| | 通路付帯設備、 仮設設備設置工事 | 電線管路埋設、給排水管路埋設、雨水排水側溝、ガードレール、カーブミラー、外灯 | [計画] | | | | | | | | | | | | | |
| | Bエリア内舗装工事 | コンクリート又はアスファルト | [計画] | | | | | | | | | | | | | |
| | 仮設工事 | 工事使用ヤードの仮囲い設置 工事用資材置き場等の整備 | [計画] | | | | | | | | | | | | | |
| D 工区 | 既存施設解体工事 | ゴミ焼却施設、事務所、既設計量機等 | [計画] | | | | | | | | | | | | | |
| | コンクリート再生材用敷地整備、 製造機設置工事 | | [計画] | | | | | | | | | | | | | |
| | 解体完了後敷地埋戻し整地 発砕機東側掘削 | コンクリート再生砕石使用 | [計画] | | | | | | | | | | | | | |
| D 工区 | 仮設置場設置工事 | びん類SY、ペットボトルSY、プラスチックSY | [計画] | | | | | | | | | | | | | |
| | 新設ストックヤード設置工事 | びん類SY、ペットボトルSY | [計画] | | | | | | | | | | | | | |
| | 外構工事 | 雨水側溝、As舗装 | [計画] | | | | | | | | | | | | | |

工事実績

1月は、新築の倉庫、小物類ストックヤードの周辺にある雨水側溝の設置やサテライトセンター、生ごみ資源化処理施設周辺の雨水配管の埋設工事を行っています。

【工事状況】



〔雨水側溝設置前〕



〔雨水側溝設置完了〕



〔雨水側溝設置前〕



〔雨水側溝設置完了〕




〔人孔柵設置完了〕



〔集水柵設置完了〕

現場全体図

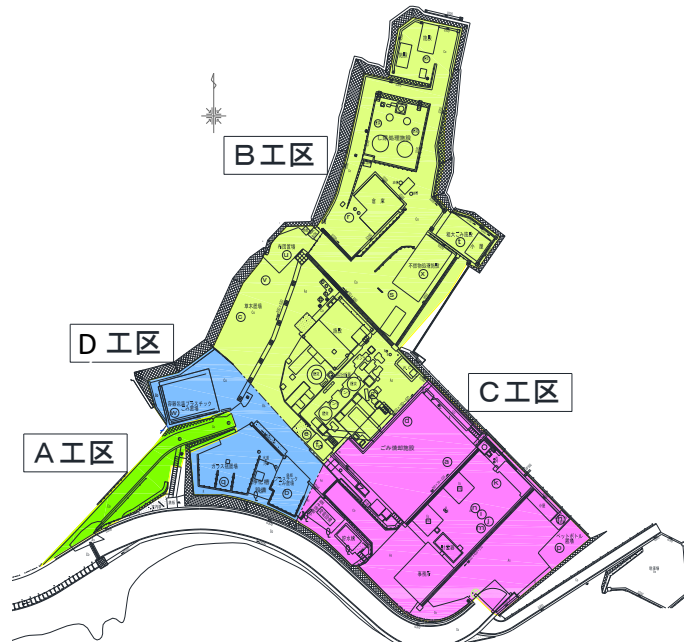

今後の予定

- 雨水排水工事
- 新設工事



ドローンによる撮影



令和6年1月18日撮影

現場代理人よりあいさつ

春の訪れを感じつつも、やはり寒い日が続いていますが、葉山町民の皆様にもお変わりはありませんでしょうか。

また、2月といえばバレンタインデーもあり、この特別な季節に日々の感謝の気持ちを大切な人たちに伝える素敵な機会となり、温まるひとときをお過ごしいただければ幸いです。

葉山町クリーンセンターでは、新築工事に先立ち擁壁の設置工事や計量機基礎の施工を行っています。引き続き、安全を心掛けながら工事を行って参りますので、ご協力の程、宜しくお願い致します。

現場代理人 岩井俊郎

連絡先

【発注者】 葉山町長

担当連絡先 葉山町クリーンセンター再整備担当
046-876-1111(内線 455・456)

【施工業者】 共和化工(株) 関東支店

担当連絡先 現場事務所(クリーンセンター2階) 046-874-5470
現場代理人 岩井俊郎
監理技術者 田端秀人 土生正元
