

葉山町クリーンセンター再整備工事のお知らせ第16号

令和5年10月1日発行

施工エリア	工事種別(計画)	施設、設備内容	計画												
			R5.3	R5.4	R5.5	R5.6	R5.7	R5.8	R5.9	R5.10	R5.11	R5.12	R6.1	R6.2	R6.3
計画	設計・許認可等	設計図書作成	[計画]												
		許認可	[計画]												
A工区	退出路の拡幅工事	既存石積、一部舗装、一部階段等の撤去	[計画]												
		擁壁工事 下水道、雨水排水路の整備工事 新規退出路の造成、舗装、路上の整備工事	[計画]												
B工区	既存施設解体工事	し尿処理施設(焼却炉)、ごみ焼却設備等	[計画]												
	仮設排水溝設置工事		[計画]												
	地盤整地工事		[計画]												
	し型構築、重力降盤設置工事		[計画]												
	敷地造成、建物基礎改良工事		[計画]												
	新設建物建設工事(1)	休憩棟	[計画]												
	2階建物		[計画]												
	新設建物建設工事(2)	倉庫、車庫棟、サテライトセンター、小物類SY、プラスチックSY	[計画]												
	1階建物		[計画]												
	新設ストックヤード設置工事	剪定株SY	[計画]												
C工区	新設計量機設置工事	基礎工事、仮設計量機用ユニットハウス、計量用パソコン設置	[計画]												
	通路付帯設備、仮設設備設置工事	電線管路埋設、給排水管路埋設、雨水排水側溝、ガードレール、カーブミラー、外灯	[計画]												
	Bエリア内舗装工事	コンクリート又はアスファルト	[計画]												
	仮設工事	工事使用ヤードの仮囲い設置 工事用資材置き場等の整備	[計画]												
	既存施設解体工事	ゴミ焼却施設、事務所、既設計量機等	[計画]												
D工区	コンクリート再生材用敷地整備、製造機設置工事		[計画]												
	解体完了後敷地埋戻し整地 発酵棟東側掘削	コンクリート再生砕石使用	[計画]												
	仮設置場設置工事	びん類SY、ペットボトルSY、プラスチックSY	[計画]												
	既存施設解体工事	既設容器包装プラスチック置場 ガラス瓶置場、プラスチックごみ置場	[計画]												
	新設ストックヤード設置工事	びん類SY、ペットボトルSY	[計画]												

工事実績

9月は、びん類ストックヤード、ペットボトルストックヤードの新設する箇所の掘削や砕石の敷込み、床部分の配筋組立を行いました。

【工事状況】



〔びん類SY施工前〕



〔ペットボトルSY施工前〕



〔びん類SY耐圧版配筋完了〕



〔ペットボトルSY耐圧版配筋完了〕




〔びん類SY耐圧版打設完了〕



〔ペットボトルSY耐圧版打設完了〕

現場全体図

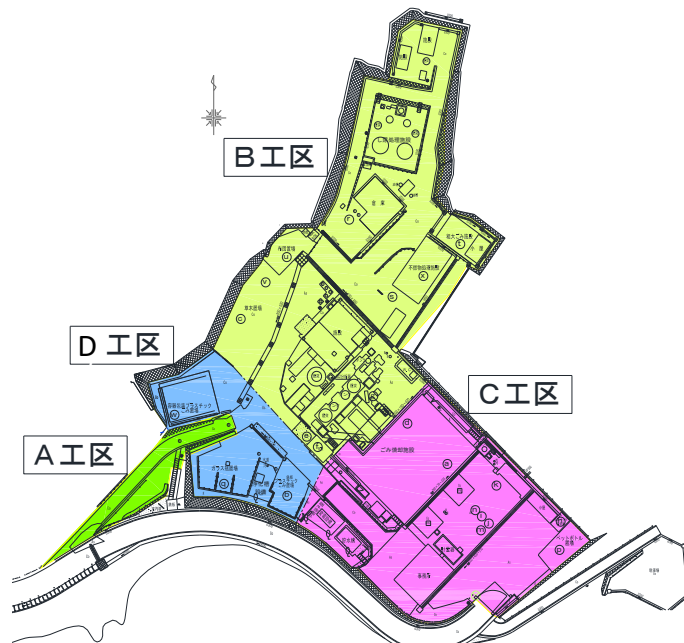

今後の予定

- …… 新築工事
- …… 造成工事



新設建物の施工に必要な高さまで造成を行っていきます。

びん類ストックヤード・ペットボトルストックヤードの壁の施工を行っていきます。

ドローンによる撮影



令和5年 9月24日撮影

現場代理人よりあいさつ

10月に入り日に日に秋が深まってきておりますが、葉山町民の皆様にもお変わりはございませんでしょうか。

これからは、秋の美しい風情を楽しみながら、お身体にお気をつけてお過ごしいただければと思います。葉山町クリーンセンターでは、新設工事に伴い多くの工事車両が通行する際は、より一層交通安全を心掛けながら工事を行って参りますので、ご協力の程、宜しくお願致します。

現場代理人 岩井俊郎

連絡先

【発注者】 葉山町長
担当連絡先 葉山町クリーンセンター再整備担当
046-876-1111(内線 455・456)

【施工業者】 共和化工(株) 関東支店
担当連絡先 現場事務所(クリーンセンター2階) 046-874-5470
現場代理人 岩井俊郎
監理技術者 田端秀人 土生正元
