

# 葉山町クリーンセンター再整備工事のお知らせ第22号

令和6年4月1日発行

施工エリア	工事種別（計画）	施設、設備内容	R6.3 R6.4 R6.5 R6.6 R6.7 R6.8 R6.9 R6.10 R6.11 R6.12 R7.1 R7.2													
			凡例 計画 — 実績													
計画	設計・許認可等	設計図書作成	[Timeline: R6.3 start, R6.4 end]													
		許認可	[Timeline: R6.5 start, R6.6 end]													
B工区	新築建物建築工事	④休憩棟 ⑪車庫棟	[Timeline: R6.4 start, R6.7 end]													
		②サテライトセンター、⑦小物類SY、⑭倉庫棟	[Timeline: R6.4 start, R6.10 end]													
		⑩倉庫	[Timeline: R6.10 start, R6.11 end]													
		⑦小物類SY	[Timeline: R6.11 start, R6.12 end]													
		⑤プラスチックSY、⑥剪定枝SY	[Timeline: R6.12 start, R7.1 end]													
C工区	新設ストックヤード設置工事	⑬計量機新設（退場時用）	[Timeline: R6.3 start, R6.4 end]													
	外構工事		[Timeline: R6.3 start, R7.2 end]													
	既存施設解体工事	ごみ焼却施設、事務所、既設計量器等	[Timeline: R6.4 start, R6.5 end]													
	解体完了後敷地埋戻し整地発酵棟東側掘削		[Timeline: R6.5 start, R6.6 end]													
	変電設備、貯水槽新設整備工事		[Timeline: R6.10 start, R6.11 end]													
D工区	新設建物建築工事	①生ごみ資源化施設、⑧資源物SY兼その他資源物スペース	[Timeline: R6.6 start, R7.2 end]													
	外構仕上工事	門扉設置、フェンス設置、植栽工事	[Timeline: R6.6 start, R7.2 end]													
U工区	③管理棟新設工事（什器備品整備）		[Timeline: R6.3 start, R7.2 end]													

## 工事実績

3月は、先月から引き続き新築建物の脇にできる重量式擁壁やごみの搬出車を計量するごみ計量機基礎の施工・機器の据付を行っています。

### 【工事状況】



〔擁壁B施工状況〕



〔擁壁B脱型完了〕



〔擁壁A設置前〕



〔擁壁A脱型完了〕




〔ごみ計量機配筋完了〕




〔ごみ計量機据付完了〕

## 現場全体図

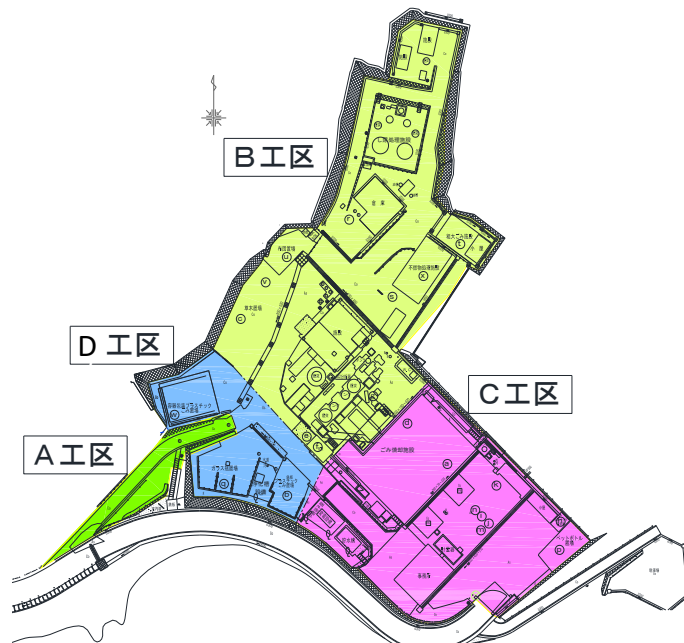


## 今後の予定

- … 新設工事
- … 解体工事

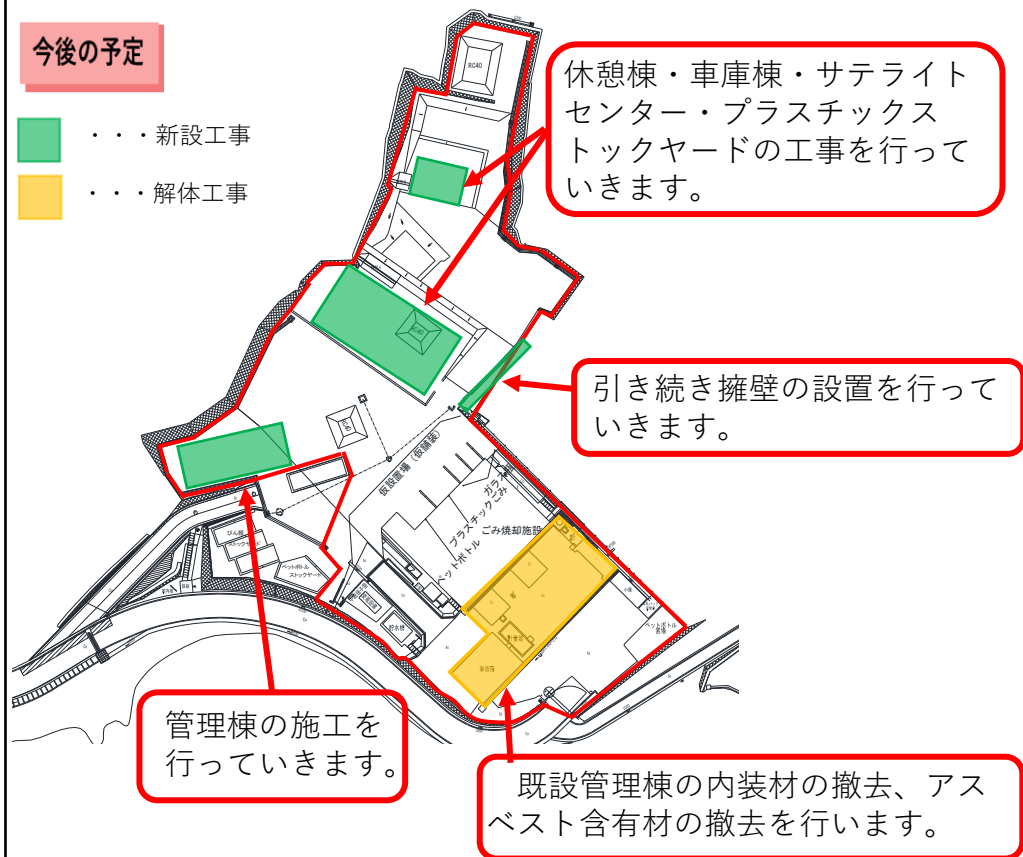

## ドローンによる撮影

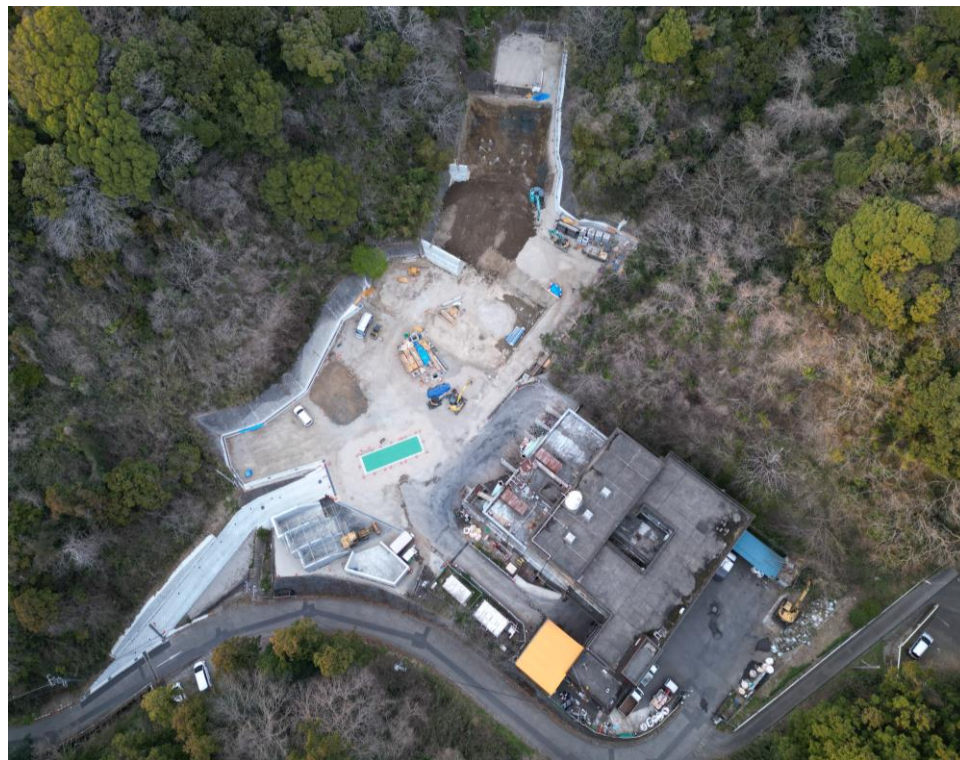

令和6年3月21日撮影

## 現場代理人よりあいさつ

春爛漫の季節となりましたが、葉山町民の皆様にもお変わりはないでしょうか。

桜が美しく咲き誇る中、新たな年度の幕開けとなり多くの行事が催される素晴らしい季節に、皆様と共に新たな目標に向かって歩みを進めることを心より楽しみにしております。

葉山町クリーンセンターでは、新築工事と解体工事のため、多くの作業が行われます。より一層に安全を心掛けながら工事を行って参りますので、ご協力の程、宜しくお願い致します。

現場代理人 岩井俊郎

## 連絡先

- 【発注者】 葉山町長  
担当連絡先 葉山町クリーンセンター再整備担当  
046-876-1111(内線 455・456)
- 【施工業者】 共和化工(株) 関東支店  
担当連絡先 現場事務所(クリーンセンター2階) 046-874-5470  
現場代理人 岩井俊郎  
監理技術者 田端秀人 土生正元
