

葉山町クリーンセンター再整備工事のお知らせ第4号

令和4年10月1日発行

工程計画

凡例 計画 ———▶ 実績 ———▶

※C・D工区は主に令和5年度以降に工事を予定しています

施工エリア	工事種別(計画)	施設、設備内容	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画	設計・許認可等	設計図書作成	●	●	●	●	●	●	●						
		許認可												●	
全般	準備工	工事事務所、工事車両駐車場等の整備・設置 廃棄物SYの移設・整備		●	●	●	●	●	●						
	仮設工事	工事使用ヤードの仮囲い設置 工事用資材置き場等の整備													●
A工区	退出路の拡幅工事	既存石積、一部舗装、一部階段等の撤去 擁壁工事													●
		下水道、雨水排水路の整備工事 新規退出路の造成、舗装、路上の整備工事													●
B工区	仮設工事	工事使用ヤードの仮囲い設置 工事用資材置き場等の整備													●
	除染対象建物の除染作業	し尿処理施設(焼却炉)、ごみ焼却炉													●
	既存施設解体工事(1)	し尿処理施設(焼却炉)、ごみ焼却設備													●
	既存施設解体工事(2)	不燃物処理施設、小屋、倉庫、地下タンク、布田置場、剪定機SY、屋外トイレ、内部ブロック積													●
	既存施設解体工事(3)	コンクリート舗装、アスファルト舗装、排水側溝													●
		仮設排水樹設置工事 地盤整地工事 L型擁壁、重力擁壁設置工事 敷地造成、建物基礎改良工事													
C工区	既存施設解体工事(1)	ごみ焼却施設													●
D工区	びん類ストックヤード整備工事	雨水排水配管、側溝整備													●

工事実績

9月では、解体工事開始前の環境測定の実施を行いました。また、解体工事期間中の粉塵等の常時測定を行うために計測器の設置や工事車両等の通行をやすくするため、仮設構台の設置を行っています。

【工事状況】



〔環境測定状況〕



〔常時測定機設置状況〕




〔仮設構台設置状況〕



〔仮設構台設置状況〕

現場全体図

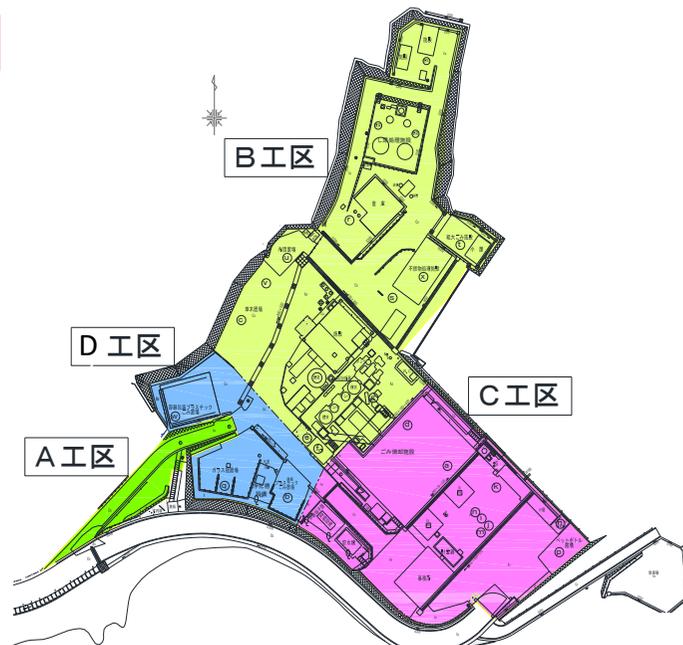

解体工事の流れ

事前調査・計画作成・各種届出

仮囲い設置・残留物の撤去

仮設養生テント・足場等設置

汚染物除去工事(ダイオキシン類等)

建屋及び設備等の解体工事

廃棄物の運搬・処理・処分

解体工事完了

今後の予定

- ……解体箇所
- ……足場設置
- ……除染範囲



- 不燃物処理施設等の解体を先行して行います。
- 除染工事用仮設資材や足場の設置を行います。
- ごみ焼却施設のダイオキシン類等の除染作業を行います。

ドローンによる撮影



令和4年9月26日撮影

現場代理人よりあいさつ

夏が終わり秋の涼しさを感じる季節となりました。
先月は、解体工事の準備として仮設関係の工事を行いました。
10月より除染用足場の設置や不燃物処理施設等の解体を行っていきます。
大型車両による解体作業用重機の搬入日には、交通安全を心がけて参りますので、ご協力の程、宜しくお願い致します。

現場代理人 岩井俊郎

連絡先

- 【発注者】 葉山町長
担当連絡先 葉山町クリーンセンター再整備担当
046-876-1111(内線 455・456)
- 【施工業者】 共和化工(株) 関東支店
担当連絡先 現場事務所(クリーンセンター2階) 046-874-5470
現場代理人 岩井俊郎
監理技術者 田端秀人 土生正元
