

葉山町クリーンセンター再整備工事のお知らせ第13号

令和5年7月1日発行

工程計画		凡例	計画	R5.3 R5.4 R5.5 R5.6 R5.7 R5.8 R5.9 R5.10 R5.11 R5.12 R6.1 R6.2 R6.3																				
施工エリア	工事種別(計画)	施設、設備内容																						
計画	設計・許認可等	設計図書作成																						
		許認可																						
A工区	退出路の拡幅工事	既存石積、一部舗装、一部階段等の撤去																						
		擁壁工事																						
B工区	既存施設解体工事	し尿処理施設(焼却炉)、ごみ焼却設備等																						
		仮設排水側設置工事																						
	地盤整地工事																							
	L型擁壁、重力擁壁設置工事																							
	敷地造成、建物基礎改良工事																							
	新設建物建設工事(1)	休憩棟																						
	新設建物建設工事(2)	倉庫、車庫棟、サテライトセンター、小物類SY、プラスチックSY																						
	新設ストックヤード設置工事	剪定枝SY																						
	新設計量機設置工事	基礎工事、仮設計量機用ユニットハウス、計量用パソコン設置																						
	通路付帯設備、仮設設備設置工事	電線管路埋設、給排水管路埋設、雨水排水側溝、ガードレール、カーブミラー、外灯																						
C工区	仮設工事	工事使用ヤードの仮囲い設置																						
		工事用資材置き場等の整備																						
		既存施設解体工事	ごみ焼却施設、事務所、仮設計量機等																					
D工区	既存施設解体工事	コンクリート再生材用敷地整備、製造機設置工事																						
		解体完了後敷地埋戻し整地	コンクリート再生砕石使用																					
	新設ストックヤード設置工事	びん類SY、ペットボトルSY、プラスチックSY																						
	新設ストックヤード設置工事	既存容器包装プラスチック置場、ガラス瓶置場、プラスチックごみ置場																						

工事実績

6月では、ごみ焼却施設の煙突下部・既設水処理施設基礎の解体、し尿処理施設地下水槽の解体等を行いました。

【工事状況】



〔ごみ焼却施設煙突下部解体前〕



〔ごみ焼却施設煙突解体完了〕



〔し尿処理施設地下水槽解体前〕



〔し尿処理施設地下水槽解体完了〕




〔再生砕石敷均し状況〕




〔再生砕石敷均し完了〕

現場全体図

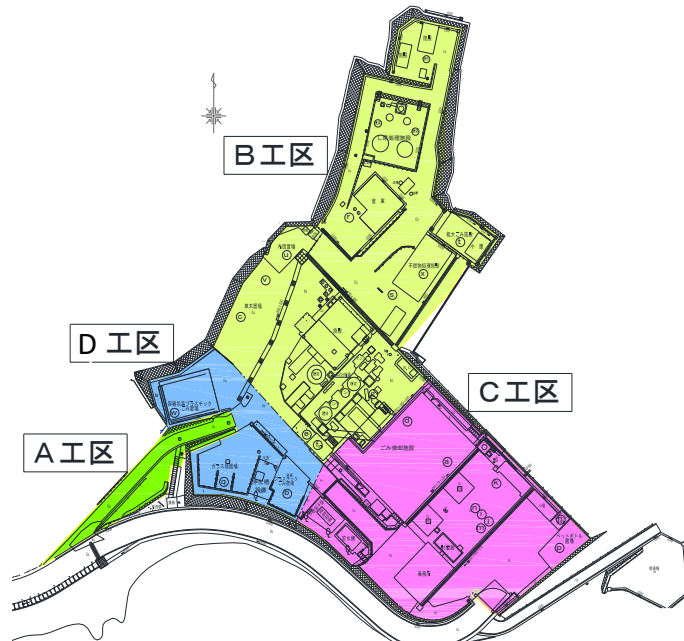

今後の予定

- …… 解体箇所
- …… 仮設工事
- …… 造成工事

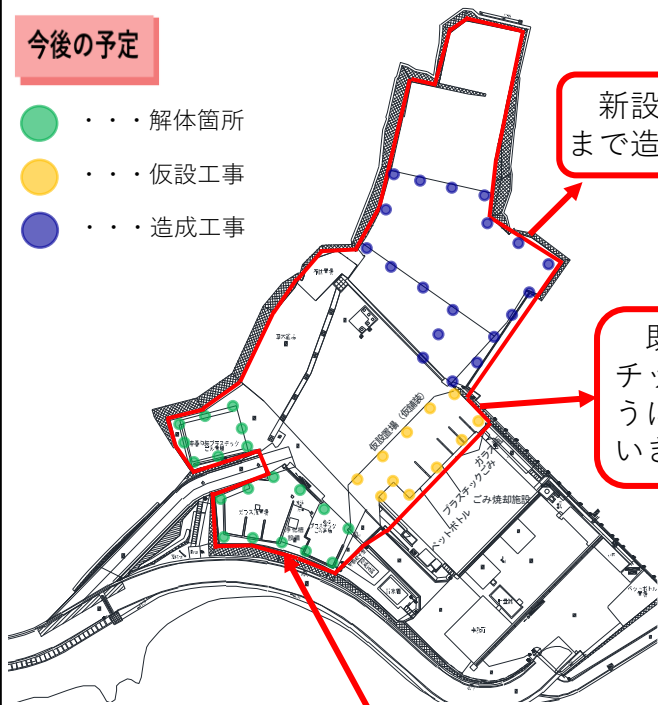

新設建物を施工に必要な高さまで造成を行っていきます。

既設ガラス瓶置場、プラスチック置場の解体を行えるように仮設置場の施工を行っていきます。

既設ガラス瓶置場、プラスチック置場の解体を行い、びん類ストックヤード・ペットボトルストックヤードの新設を行っていきます。

ドローンによる撮影



令和5年 6月14日撮影

現場代理人よりあいさつ

いよいよ梅雨開けも近づき夏本番も迫っていますが、葉山町民の皆様にもお変わりはございませんでしょうか。

7月に入り海開きや花火大会などの夏の風物詩のイベントが控えており、多くの方々が訪ねることだと思います。葉山町クリーンセンターでは、新しい施設を建てるための準備作業を行っていきます。それに伴い、工事車両が入場が頻繁に行われる日もありますが、引き続き交通安全を心掛けながら工事を行って参りますので、ご協力の程、宜しくお願い致します。

現場代理人 岩井俊郎

連絡先

【発注者】 葉山町長
担当連絡先 葉山町クリーンセンター再整備担当
046-876-1111(内線 455・456)

【施工業者】 共和化工(株) 関東支店
担当連絡先 現場事務所(クリーンセンター2階) 046-874-5470
現場代理人 岩井俊郎
監理技術者 田端秀人 土生正元
