

葉山町クリーンセンター再整備工事のお知らせ第3号

令和4年9月1日発行

工程計画

凡例 計画 —●— 実績 —●—

※C・D工区は令和5年度以降に工事を予定しています

施工エリア	工事種別(計画)	施設、設備内容	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画	設計・許認可等	設計図書作成	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		許認可													●
全般	準備工	工事事務所、工事車両駐車場の整備・設置 廃棄物SYの移設・整備		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	仮設工事	工事使用ヤードの仮囲い設置 工事用資材置き場の整備		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A工区	退出路の拡幅工事	既存石積、一部舗装、一部階段等の撤去 新規石積、下水道、雨水排水路の整備工事 新規退出路の造成、舗装、路上の整備工事													
	仮設工事	工事使用ヤードの仮囲い設置 工事用資材置き場の整備													
B工区	除染対象建物の除染作業	し尿処理施設(焼却炉)、ごみ焼却炉													
	既存施設解体工事(1)	し尿処理施設(焼却炉)、ごみ焼却設備													
	既存施設解体工事(2)	不燃物処理施設、小屋、倉庫、地下タンク、布団置場、野定枝SY、屋外トイレ、内部ブロック積													
	既存施設解体工事(3)	コンクリート舗装、アスファルト舗装、排水側溝													
	仮設排水樹設置工事 地盤整地工事 L型擁壁、重力擁壁設置工事 敷地造成、建物基礎改良工事														

工事実績

8月では、解体工事における工事エリアと運営エリアの区分を行うために仮囲いの設置しました。また既存施設運営時に使用していた重油・消石灰の撤去作業をしました。引き続き解体工事中に仮運用を安全に行えるように仮設工事等を行います。

【工事状況】



〔仮囲い設置完了〕




〔重油タンク撤去前〕




〔重油タンク撤去完了〕

現場全体図

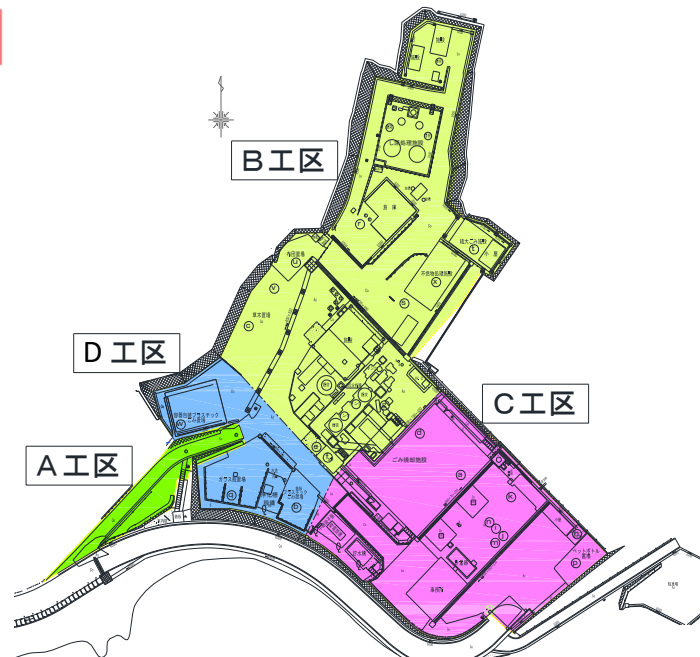

今後の予定

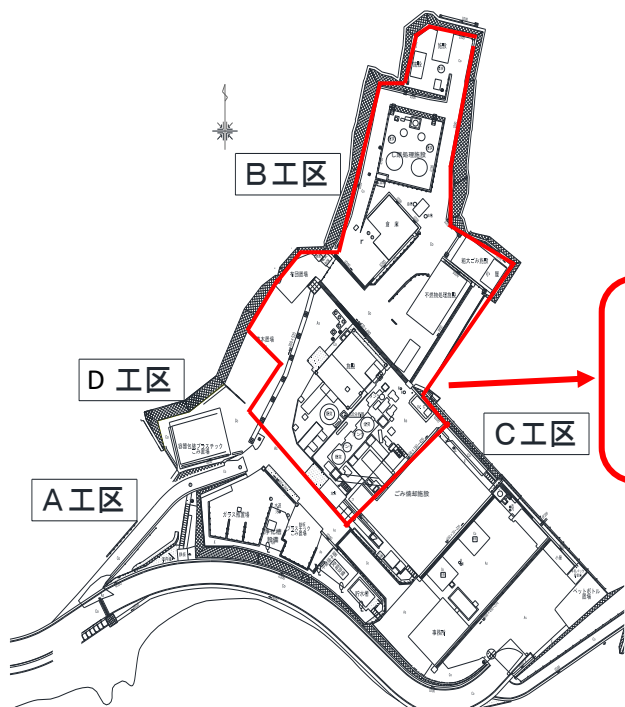

B工区解体工事を安全に行うために、ごみ焼却施設等の除染工事を9月から行います。

ドローンによる撮影



令和4年8月25日撮影

現場代理人よりあいさつ

日中の暑さはまだまだ厳しい昨今ですが、体調にお変わりはないでしょうか。

先月は、クリーンセンター再整備工事の請負業者として、工事を安全に行えるように葉山郷総鎮守 森戸大明神で工事安全祈願祭を行いました。工事期間中に安全作業を心がけていきますので、ご協力の程、宜しくお願い致します。

【森戸大明神での安全祈願の様子】



現場代理人 岩井俊郎

連絡先

【発注者】 葉山町長
担当連絡先 葉山町クリーンセンター再整備担当
046-876-1111(内線 455・456)

【施工業者】 共和化工(株) 関東支店
担当連絡先 現場事務所(クリーンセンター2階) 046-874-5470
現場代理人 岩井俊郎
監理技術者 田端秀人 土生正元
