

葉山町クリーンセンター再整備工事のお知らせ第9号

令和5年3月1日発行

工程計画

凡例 計画 —●— 実績 —●—

※C・D工区は主に令和5年度以降に工事を予定しています

施工エリア	工事種別(計画)	施設、設備内容	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画	設計・許認可等	設計図書作成	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		許認可													
全般	準備工	工事事務所、工事車両駐車場等の整備・設置 廃棄物SYの移設・整備		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	A工区	仮設工事	工事使用ヤードの仮囲い設置 工事用資材置き場等の整備												
退出路の拡幅工事		既存石積、一部舗装、一部階段等の撤去 擁壁工事 下水道、雨水排水路の整備工事 新規退出路の造成、舗装、路上の整備工事													
B工区	仮設工事	工事使用ヤードの仮囲い設置 工事用資材置き場等の整備													
	除染対象建物の除染作業	し尿処理施設(焼却炉)、ごみ焼却炉													
	既存施設解体工事(1)	し尿処理施設(焼却炉)、ごみ焼却設備													
	既存施設解体工事(2)	不燃物処理施設、小屋、倉庫、地下タンク、布団置場、剪定機SY、屋外トイレ、内部ブロック積													
	既存施設解体工事(3)	コンクリート舗装、アスファルト舗装、排水側溝													
C工区	仮設排水樹設置工事														
	地盤整地工事														
	L型擁壁、重力擁壁設置工事 敷地造成、建物基礎改良工事														
D工区	既存施設解体工事(1)	ゴミ焼却施設													
D工区	びん類ストックヤード整備工事	雨水排水配管、側溝整備													

工事実績

2月では、ごみ焼却施設のダイオキシン類の除染作業、し尿処理施設の足場の設置や飛散防止養生・ダイオキシン類の除染作業を行っています。

【工事状況】



〔ごみ焼却施設除染状況〕



〔ごみ焼却施設除染状況〕



〔し尿処理施設足場設置状況〕



〔し尿処理施設足場設置完了〕




〔し尿処理施設内部状況〕



〔し尿処理施設除染状況〕

現場全体図

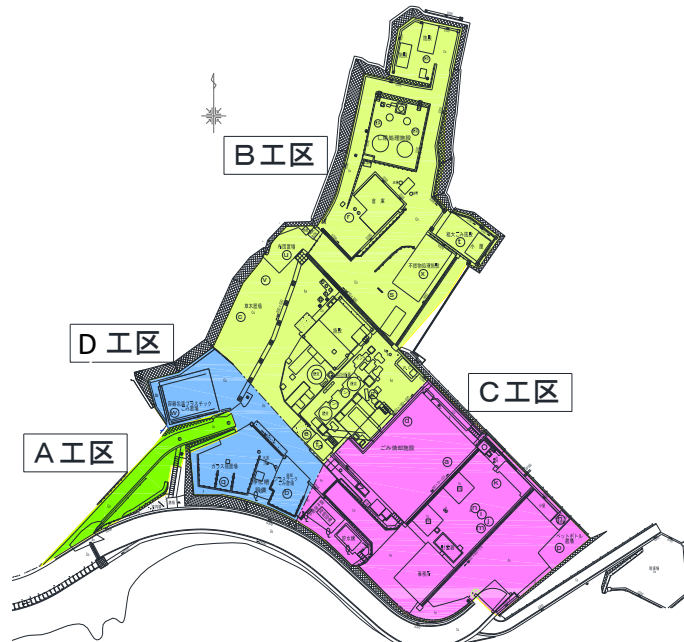

今後の予定

- … 足場設置
- … 除染範囲
- … 解体箇所



・し尿処理施設の足場の解体作業を行い、施設の解体工事を行います。
・ごみ焼却施設の解体工事を行います。
・ごみ焼却施設の解体完了後から煙突に除染用の足場の設置を行い、ダイオキシン類の除染・解体を行います。

既存の退出路を一度取り壊し、退出路の拡幅工事、擁壁工事、雨水・排水工事を行います。

ドローンによる撮影



令和5年2月4日撮影

現場代理人よりあいさつ

三月を迎えて日増しに暖かくなってはきましたが、朝夕はまだ少し冷えますのでお風邪など召ませぬようお気をつけください。

先月は、ごみ焼却施設では、ダイオキシン類の除染作業を行い、完了後に仮設テントと足場の解体を行っています。し尿処理施設で足場の設置や飛散防止養生を行い、ダイオキシン類の除染作業を行っています。今後、本格的な解体作業が始まりごみの搬出車両等が多く出入りしますので、交通安全を心掛けながら工事を進めて参りますので、ご協力の程、宜しくお願い致します。

現場代理人 岩井俊郎

連絡先

【発注者】 葉山町長

担当連絡先 葉山町クリーンセンター再整備担当
046-876-1111(内線 455・456)

【施工業者】 共和化工(株) 関東支店

担当連絡先 現場事務所(クリーンセンター2階) 046-874-5470
現場代理人 岩井俊郎
監理技術者 田端秀人 土生正元
