


葉山町クリーンセンター再整備工事のお知らせ第10号

令和5年4月1日発行


| 工程計画 | | 凡例 | 計画 | R5.3 R5.4 R5.5 R5.6 R5.7 R5.8 R5.9 R5.10 R5.11 R5.12 R6.1 R6.2 R6.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 施工エリア | 工事種別(計画) | 施設、設備内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画 | 設計・許認可等 | 設計図書作成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 許認可 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A工区 | 退出路の拡幅工事 | 既存石積、一部舗装、一部階段等の撤去 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 擁壁工事 下水道、雨水排水路の整備工事 新規退出路の造成、舗装、路上の整備工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B工区 | 既存施設解体工事 | し尿処理施設(焼却炉)、ごみ焼却設備等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 仮設排水溝設置工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地盤整地工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L型擁壁、重力擁壁設置工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 敷地造成、建物基礎改良工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 新設建物建設工事(1) | 休憩棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 新設建物建設工事(2) | 倉庫、車庫棟、サテライトセンター、小物類SY、プラスチックSY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C工区 | 仮設工事 | 工事使用ヤードの仮囲い設置 工事用資材置き場等の整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 既存施設解体工事(1) | ごみ焼却施設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 既存施設解体工事(2) | 事務所、既設計量機、ペットボトル置場 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 既存施設解体工事(3) | 既設南側スロープ、北東崖下排水側溝 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | コンクリート再生材用敷地整備、製造機設置工事 解体完了後敷地埋戻し整地 充砕棟東側掘削 | コンクリート再生砕石使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

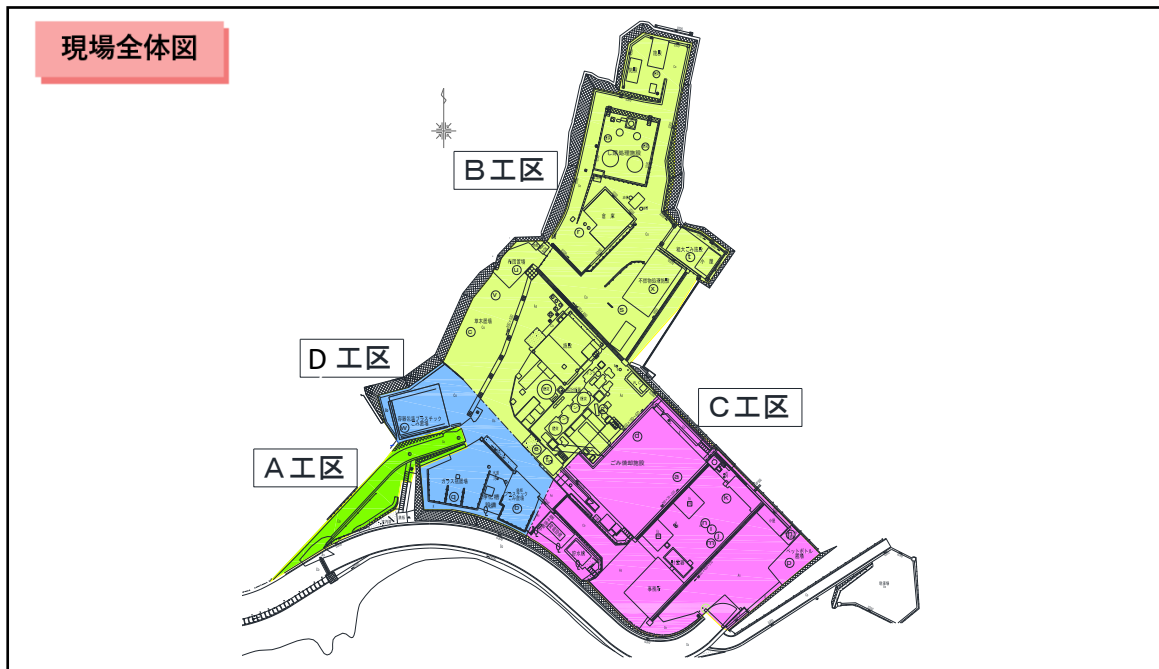


工事実績

3月では、ごみ焼却施設・し尿処理施設の解体を行っています。ごみ焼却施設施設の煙突周りの解体後、足場を設置し除染を行っています。また、A工区では、道の拡幅を行う為の石積ブロックの設置を行っています。

【工事状況】



〔煙突足場設置完了〕



〔ごみ焼却施設煙突除染状況〕



〔し尿処理施設解体状況〕



〔し尿処理施設解体状況〕



〔退出路擁壁設置前〕



〔退出路擁壁設置完了〕

今後の予定

- 除染範囲
- 解体箇所



・し尿処理施設とごみ焼却施設の基礎部分の解体工事を引き続き行います。
・ごみ焼却施設の煙突の解体を行って行きます。

退出路の雨水側溝、下水配管等の敷設を行い、コンクリート舗装を行います。

ドローンによる撮影



令和5年 3月31日撮影

現場代理人よりあいさつ

【クリーンセンターの桜の様子】

各地からの花の便りが届くにぎやかな季節となりました。皆様、お健やかに過ごしてはいかがでしょうか。葉山町クリーンセンターの桜も満開となり、春らしい気分に包まれています。新年度が始まり、入学や入社 of 時期となりますので、工事車両の搬出入時には、交通安全を常に心掛けながら、工事を進めて参りますので、ご協力の程、宜しくお願い致します。



現場代理人 岩井俊郎

連絡先

- 【発注者】 葉山町長
担当連絡先 葉山町クリーンセンター再整備担当 046-876-1111(内線 455・456)
- 【施工業者】 共和化工(株) 関東支店
担当連絡先 現場事務所(クリーンセンター2階) 046-874-5470
現場代理人 岩井俊郎
監理技術者 田端秀人 土生正元
